Casa de la Cultura Jurídica
TEPIC, NAYARIT

Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de bienes y/o servicios

En términos de lo previsto en los artículos *3 fracción XXI, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y el Capítulo IV del Título Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como en el punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas* se suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas de la persona física, José Roberto Zazueta González considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos normativos, y conforme a las resoluciones emitidas los días 16 de octubre de 2020, 6 de octubre de 2022 y 28 de febrero de 2024, por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificadas con el número: CT-CUM/A-10-2020-III, CT-VT-A-13-2022 y CT-VT/A-3-2024 disponibles en los links: https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2022-11/CT-CUM-A-10-2020-III_1.pdf y https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-05/CT-VT-A-13-2022.pdf en las que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de 4 páginas y es parte integrante de la versión pública del Acta de Entrega Recepción relacionado con el contrato 70240277, relativo al Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas, por el periodo del 30 de Agosto al 29 de Septiembre de 2024 para la Casa de la Cultura Jurídica en Tepic, Nayarit, adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Mtra. Gabriela Iliana Ulloa Ponce de León
Directora de la Casa de la Cultura Jurídica en Tepic, Nayarit

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
Contrato Simplificado No 70240277

Siendo las 11:00 horas del día 05 de diciembre de 2024, con fundamento en el artículo 177 del Acuerdo General de Administración XIV/2019, del siete de noviembre de dos mil diecinueve, del Comité de Gobierno y Administración por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Alto Tribunal , así como en el **artículo 35 fracción XXIII del Reglamento Orgánico en Materia de Administración**, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se congregan en convocatoria de trabajo para realizar el acta de entrega-recepción del contrato simplificado **No**. **70240277**, del "Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas de la Casa de la Cultura Jurídica en Tepic, Nayarit", se reúnen para efecto de dar cumplimiento a esta gestión: en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ing. Julio Cesar Hernández Valencia, Profesional Operativo, asignado de la Dirección General de Infraestructura Física y la Maestra Gabriela Iliana Ulloa Ponce de León, Directora de la Casa de la Cultura Jurídica, y por parte del prestador de servicios Ing. José Roberto Zazueta González.

Lo anterior a efecto de realizar el acto de Entrega-Recepción de los trabajos objeto de este contrato de servicios **No**. **70240277,** relativo al "Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas de la Casa de la Cultura Jurídica en Tepic, Nayarit".

ANTECEDENTES

Con fecha 30 de agosto del 2024, se firmó el contrato simplificado **No**. **70240277** de los servicios relativos al "Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas de la Casa de la Cultura Jurídica en Tepic, Nayarit", con un monto original de contrato de $ 110,953.18 (Ciento diez mil novecientos cincuenta y tres pesos 18/100) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de $ 17,752.51 (Diecisiete mil setecientos cincuenta y dos pesos 51/100) Resultando un monto neto de $128,705.69 (Ciento veintiocho mil setecientos cinco pesos 69/100).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en este contrato, no otorgar anticipo alguno y hacer un pago para el término y aceptación de los trabajos por parte de la supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física, llevado a cabo de manera remota a través de un Listado de Verificación.

Es decir, cubrir si así procede los $ 110,953.18 (Ciento diez mil novecientos cincuenta y tres pesos 18/100) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de $ 17,752.51 (Diecisiete mil setecientos cincuenta y dos pesos 51/100). Resultando un monto

k4v8EcvTNoldbThmf4wg/FogyyJfFocywfEXtwkqiuE=

total de $128,705.69 (Ciento veintiocho mil setecientos cinco pesos 69/100) para pagarse en una sola exhibición al cierre administrativo del contrato.

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificatorio por la naturaleza de los trabajos. En lo casos de reducción o ampliación de trabajos, los mismo se indicarán en el finiquito.

El plazo de ejecución del “contrato original” fue de treinta días naturales comprendido del día 30 de agosto del 2024 al día 29 de septiembre del 2024 de acuerdo con los registros y a los plazos de término del contrato.

HECHOS

De conformidad con lo señalado en el artículo 177, párrafo séptimo del citado Acuerdo General de Administración XIV/2019, el prestador de servicios dio aviso de la finalización de los trabajos por medio de la carta de terminación, el pasado 23 de septiembre del 2024, concluyendo los trabajos el día 29 de septiembre del 2024, a fin de que el área técnica se encuentre en condiciones de solicitar la documentación necesaria para llevar a cabo las acciones de verificación para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice la debida conclusión de los trabajos.

En virtud de las determinaciones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en atención al desarrollo de la emergencia sanitaria generada por la epidemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), la Dirección General de Infraestructura Física se encuentra atendiendo la entrega recepción de los mantenimientos de manera remota, con apoyo del personal de las Casas de la Cultura Jurídica, por lo que el mecanismo se detallará a continuación:

k4v8EcvTNoIdbThmf4wg/FogyyJfFocywfEXtwkqiuE=

[redacted]

En principio constatándose los alcances descritos a continuación:

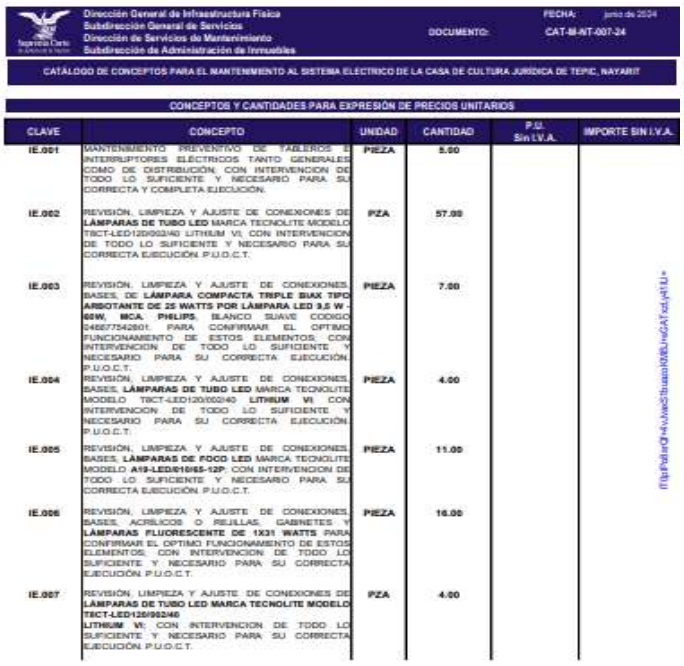

Dirección General de Infraestructura Física
Subdirección General de Servicios
Dirección de Servicios de Mantenimiento
Subdirección de Administración de Inmuebles

FECHA: junio de 2024
DOCUMENTO: CAT-M-INT-007-24

CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO DE LA CASA DE CULTURA JURIDICA DE TEPIC, NAYARIT

CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. Sin I.V.A.	IMPORTE SIN I.V.A.
IE.001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS E INTERRUPTORES ELÉCTRICOS TANTO GENERALES COMO DE DISTRIBUCIÓN, CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	5.00		
IE.002	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE **LÁMPARAS DE TUBO LED** MARCA TECNOLITE MODELO TRCT-LED120/002/40 LITHIUM VI; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	57.00		
IE.003	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, DE **LÁMPARA COMPACTA TRIPLE 8WAX TIPO ARBOTANTE DE 25 WATTS POR LÁMPARA LED 3,5 W - 60W, MCA. PHILIPS**, BLANCO SUAVE, CODIGO 046677542801; PARA CONFIRMAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PIEZA	7.00		
IE.004	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, **LÁMPARAS DE TUBO LED** MARCA TECNOLITE MODELO TRCT-LED120/002/40 **LITHIUM VI**; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PIEZA	4.00		
IE.005	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, **LÁMPARAS DE FOCO LED** MARCA TECNOLITE MODELO **A19-LED/010/65-12P**; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PIEZA	11.00		
IE.006	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, ACRÍLICOS O REJILLAS, GABINETES Y **LÁMPARAS FLUORESCENTE DE 1X31 WATTS** PARA CONFIRMAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PIEZA	16.00		
IE.007	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE **LÁMPARAS DE TUBO LED MARCA TECNOLITE MODELO TRCT-LED120/002/40 LITHIUM VI**; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	4.00		

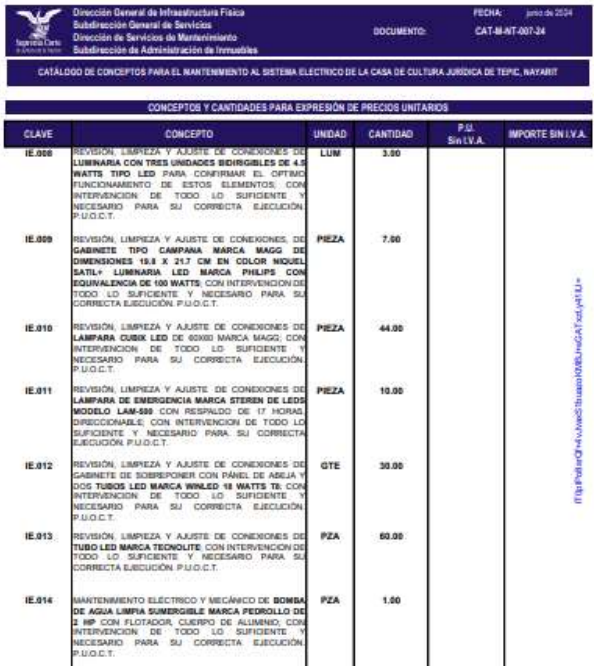

Dirección General de Infraestructura Física
Subdirección General de Servicios
Dirección de Servicios de Mantenimiento
Subdirección de Administración de Inmuebles

FECHA: junio de 2024
DOCUMENTO: CAT-M-INT-007-24

CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO DE LA CASA DE CULTURA JURIDICA DE TEPIC, NAYARIT

CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. Sin I.V.A.	IMPORTE SIN I.V.A.
IE.008	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE **LUMINARIA CON TRES UNIDADES BIDIRIGIBLES DE 4.5 WATTS TIPO LED** PARA CONFIRMAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	LUM	3.00		
IE.009	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, DE **GABINETE TIPO CAMPANA MARCA MAGG DE DIMENSIONES 19.8 X 21.7 CM EN COLOR NIQUEL SATIL+ LUMINARIA LED MARCA PHILIPS CON EQUIVALENCIA DE 100 WATTS**; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PIEZA	7.00		
IE.010	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE **LÁMPARA CUBIX LED** DE 60X60 MARCA MAGG; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PIEZA	44.00		
IE.011	REVISIÓN LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE **LAMPARA DE EMERGENCIA MARCA STEREN DE LEDS MODELO LAM-500** CON RESPALDO DE 17 HORAS, DIRECCIONABLE; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PIEZA	10.00		
IE.012	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE GABINETE DE SOBREPONER CON PÁNEL DE ABEJA Y DOS **TUBOS LED MARCA WHILED 18 WATTS T8**; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	GTE	30.00		
IE.013	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE **TUBO LED MARCA TECNOLITE**; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	60.00		
IE.014	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y MECÁNICO DE **BOMBA DE AGUA LIMPIA SUMERGIBLE MARCA PEDROLLO DE 2 HP** CON FLOTADOR, CUERPO DE ALUMINIO; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	1.00		

Dirección General de Infraestructura Física
Subdirección General de Servicios
Dirección de Servicios de Mantenimiento
Subdirección de Administración de Inmuebles

FECHA: junio de 2024
DOCUMENTO: CAT-M-INT-007-24

CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO DE LA CASA DE CULTURA JURIDICA DE TEPIC, NAYARIT

CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. Sin I.V.A.	IMPORTE SIN I.V.A.
IE.014.1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, COLOCACIÓN Y ENERGIZACIÓN DE CABLE DE COBRE MONOPOLAR TIPO THW-LS VINANEL XXI, MARCA CONDUMEX, 600 V, Y 90°C DE OPERACIÓN, CALIBRE 5.26 MM² (10 AWG) EN **COLOR BLANCO**. SE DEBERÁN DE CONSIDERAR, GUIADO, ACCESORIOS TIPO CAPUCHÓN PARA CONEXIONES, ENCINTADO DE CONEXIONES, PRUEBAS DE CONTINUIDAD Y RESISTENCIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.C.T.	ML	15.00		
IE.014.2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, COLOCACIÓN Y ENERGIZACIÓN DE CABLE DE COBRE MONOPOLAR TIPO THW-LS VINANEL XXI, MARCA CONDUMEX, 600 V, Y 90°C DE OPERACIÓN, CALIBRE 5.26 MM² (10 AWG) EN **COLOR NEGRO**. SE DEBERÁN DE CONSIDERAR, GUIADO, ACCESORIOS TIPO CAPUCHÓN PARA CONEXIONES, ENCINTADO DE CONEXIONES, PRUEBAS DE CONTINUIDAD Y RESISTENCIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.C.T.	ML	15.00		
IE.014.3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, COLOCACIÓN Y ENERGIZACIÓN DE CABLE DE COBRE MONOPOLAR TIPO THW-LS VINANEL XXI, MARCA CONDUMEX, 600 V, Y 90°C DE OPERACIÓN, CALIBRE 3.31 MM² (12 AWG) EN **COLOR VERDE**. SE DEBERÁN DE CONSIDERAR, GUIADO, ACCESORIOS TIPO CAPUCHÓN PARA CONEXIONES, ENCINTADO DE CONEXIONES, PRUEBAS DE CONTINUIDAD Y RESISTENCIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.C.T.	ML	15.00		
IE.014.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA EN COLOR BLANCO SIN VISIÓN TMK1620, 16 X 20 MM, 5161-01200 O SIMILAR, EN DISTINTOS PUNTOS DEL EDIFICIO DE LA CASA DE LA CULTURA JURIDICA DE TEPIC INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	14.00		
IE.014.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC TIPO PESADO 13 MM DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.C.T.	ML	22.00		
IE.015	REVISIÓN, AJUSTE, APRETE DE TORNILLERIA Y LIMPIEZA DE **CONTACTO POLARIZADO DUPLEX**; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PIEZA	68.00		

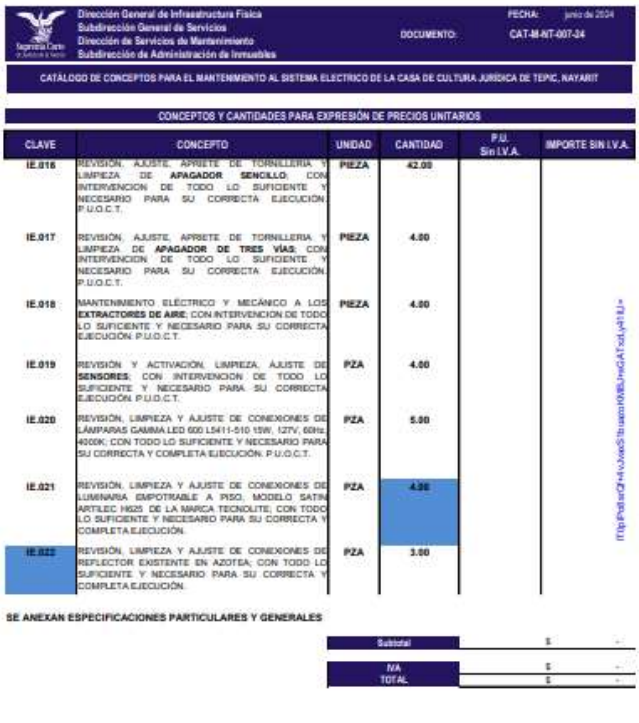

Dirección General de Infraestructura Física
Subdirección General de Servicios
Dirección de Servicios de Mantenimiento
Subdirección de Administración de Inmuebles

FECHA: junio de 2024
DOCUMENTO: CAT-M-INT-007-24

CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO DE LA CASA DE CULTURA JURIDICA DE TEPIC, NAYARIT

CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. Sin I.V.A.	IMPORTE SIN I.V.A.
IE.016	REVISIÓN, AJUSTE, APRETE DE TORNILLERIA Y LIMPIEZA DE **APAGADOR SENCILLO**; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PIEZA	42.00		
IE.017	REVISIÓN, AJUSTE, APRETE DE TORNILLERIA Y LIMPIEZA DE **APAGADOR DE TRES VÍAS**; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PIEZA	4.00		
IE.018	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y MECÁNICO A LOS **EXTRACTORES DE AIRE**; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PIEZA	4.00		
IE.019	REVISIÓN Y ACTIVACIÓN, LIMPIEZA, AJUSTE DE **SENSORES**; CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	4.00		
IE.020	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LÁMPARAS GAMMA LED 600 L5411-510 15W, 127V, 60Hz, 4000K; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	5.00		
IE.021	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LUMINARIA EMPOTRABLE A PISO, MODELO SATIN ARTLEC H625 DE LA MARCA TECNOLITE; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	4.00		
IE.022	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE REFLECTOR EXISTENTE EN AZOTEA; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	3.00		

SE ANEXAN ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y GENERALES

Subtotal	$ -
IVA	$ -
TOTAL	$ -

El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte del apoyo técnico de la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un “Listado de Verificación”, que auxilió a integrar el administrador del contrato, a fin de que se apreciara el resultado de los alcances

k4v8EcvTNoIdbThmf4wg/FogyyJfFocywfEXtwkqiuE=

incluidos dentro del contrato original y demás documentos que lo conforman, y así se constate el cumplimiento contractual.

CONCLUSIÓN

Los trabajos motivo del contrato simplificado adjudicación directa **No. 70240277,** relativo a los trabajos del **"Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas de la Casa de la Cultura Jurídica en Tepic, Nayarit"** fueron concluidos en fecha de término comprometida, de acuerdo con los alcances y especificaciones de los conceptos del catálogo, proporcionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

	RESUMEN DE IMPORTES	
A	IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA	$ 110,953.18
	RELACIÓN DE ESTIMACIONES	
B	**NÚMERO DE ESTIMACIÓN**	**IMPORTE ESTIMADO SIN IVA**
	ESTIMACIÓN UNO	$ 000.00
	ESTIMACIÓN DOS	$ 000.00
	ESTIMACIÓN N	$ 000.00
C	**SUMA DE ESTIMACIONES**	**$ 000.00**
D	ESTIMACIÓN DE FINIQUITO	$ 110,953.18
E	**SUBTOTAL (C+D)**	**$ 110,953.18**
F	**TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E)**	**$ 000.00**
G	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	$ 17,752.51
H	RETENCIÓN DE IVA	$ 000.00
I	RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES	$ 000.00
J	DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES*	$ 000.00
K	**NETO A PAGAR**	**$ 128,705.69**

Como parte de la presente Acta de Entrega-Recepción se anexan los siguientes documentos:

	SI	NO	NO APLICA
Planos ó croquis correspondientes actualizados (Planos As built):	( )	( )	(X)
Manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes:	( )	( )	(X)

k4v8EcvTNoldbThmf4wg/FogyyJfFocywfEXtwkqiuE=

Certificados de Garantía de calidad y funcionamiento de los equipos instalados:	( )	( )	(X)

El archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos se integra en el repositorio del sistema establecido para tal efecto por el que se notifica al apoyo técnico.

El prestador de servicios hace entrega de la estimación, carátula de estimación, resumen de partidas e informe por escrito con soporte fotográfico.

No habiendo más que asentar se cierra la presente acta entrega-recepción, firmando al calce y al margen por quienes participan, manifestando su conformidad en el contenido de la presente y reservándose la Suprema Corte de Justicia de la Nación la aplicación de la garantía otorgada, por fallas que presenten los trabajos motivo de este contrato, así como el derecho de hacer cualquier reclamación por vicios ocultos y/u observaciones que surjan de una futura revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siendo las 12:30 horas del día 05 de diciembre de 2024

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA "MINISTRO ENRIQUE MARTINEZ ULLOA" EN TEPIC NAYARIT

Maestra Gabriela Iliana Ulloa Ponce de León
Directora CCJ Tepic, Nayarit

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

Ing. Julio Cesar Hernández Valencia,
Profesional Operativo,
Dirección General de Infraestructura Física

POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS

[redacted]

Ing. José Roberto Zazueta González.

k4v8EcvTNoldbThmf4wg/FogyyJfFocywfEXtwkqiuE=
